

۱r.	0	% Voi Abgeschlossen	rgangsi Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	07. Okt	
1	~	100% =	BPM -Start	134,25 Tage	Mi 09.10.13	Di 15.04.14			IVI	IVI D F
2	<b>~</b>	100% 📌	Inception	0 Tage	Di 29.10.13	Di 29.10.13			-	
3	<b>√</b>	100% 📌	Lifecyle Objective Mile		Di 29.10.13	Di 29.10.13				
4	✓	100% 🕏	Business Modelling	-	Di 29.10.13	Di 29.10.13				
5	<b>√</b>	100% 📌	Requirements	13,88 Tage	Mi 09.10.13	Mo 28.10.13			•	
6	✓	100% 📌	Use Cases Identifizie	ren 0,5 Std.	Mi 09.10.13	Mi 09.10.13		Benedikt[50%];Ma		Benedik
7	✓	100% 📌	SRS verfassen	6 Std.	Mi 16.10.13	Mi 16.10.13		Benedikt[50%];Ma		
8	✓	100% 📌	Analysis & Design	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13				
9	✓	100% 📌	Implementation	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13				
10	✓	100% 🕏	Test	2 Tage	Mo 14.10.13	Di 15.10.13				
11	$\checkmark$	100% 📌	Android Einarbeitun	g 16 Std.	Mo 14.10.13	Di 15.10.13		Mario[50%]		
12	$\checkmark$	100% 📌	Deployment	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13				
13	$\checkmark$	100% 📌	Configuration & Chang	ge Managemen 1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13				
14	$\checkmark$	100% 🕏	Project Management	1,18 Tage	Mi 30.10.13	Do 31.10.13				
15	$\checkmark$	100% 📌	Rollen verteilen	1 Std.	Mi 30.10.13	Mi 30.10.13		Benedikt;Mario		
16	✓	100% 📌	Projektplan ersteller	a 3,4 Std.	Mi 30.10.13	Do 31.10.13		Benedikt;Mario[30		
17	✓	100% 🕏	Environment	11,25 Tage	Mo 14.10.13	Di 29.10.13				
18	<b>√</b>	100% 📌	IDE einrichten	11 Std.	Mo 14.10.13	Di 15.10.13		Benedikt[50%];Ma		
19	<b>√</b>	100% 📌	Calabash einrichten	2 Std.	Di 29.10.13	Di 29.10.13		Benedikt[0%];Mari		
20	<b>√</b>	100% 📌	Versionsverwaltung	4 Std.	Mo 14.10.13	Mo 14.10.13		Benedikt		
21	<b>√</b>	100% 📌	Elaboration	0 Tage	Di 29.10.13	Di 29.10.13				
22	<b>√</b>	100% 📌	Lifecycle Architecture I	Milestone 0 Tage	Fr 20.12.13	Fr 20.12.13				
23	<b>√</b>	100% 📌	Business Modelling	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13				
24	<b>√</b>	100% 🕏	Requirements	1,25 Tage	Mi 09.10.13	Do 10.10.13			•	
25	✓	100% 📌	Use Cases ausarbeit	en 10 Std.	Mi 09.10.13	Do 10.10.13		Benedikt[50%];Ma		
			Vorgang	Externer Meiler	stein 🔷		Manueller Sa	ammelrollup		
			Unterbrechung	Inaktiver Vorga	ng $\Box$		Manueller Sa	ammelvorgang 🕶		
Drojok	rt: Toan	mwarkar	Meilenstein •	Inaktiver Meiler	_		Nur Anfang	<b>.</b>		
		nworker 1.06.14	Sammelvorgang	Inaktiver Samm			Nur Ende	_		
			Projektsammelvorgang	Manueller Vorg			Stichtag			
			Externe Vorgänge	Nur Dauer	J		In Arbeit	-		_
			1	Seite 1						

r.	0	% Vor Abgeschlossen	gangsi Vorgangsname	Daue	er Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	07. Okt '13 M D M D
26	~	100%	UC1	2 Sto	d. Mi 09.10	13 Mi 09.10.13			
27	<i>-</i>	100%	UC2	2 Sto					
28	<u> </u>	100%	UC3	2 Sto					
29	·	100%	UC4	2 Sto					
30	<u> </u>	100%	UC5	2 Sto					
31	<b>~</b>	100% 🕏	Analysis & Design		Tage Di 29.10.				
32	<b>√</b>	100%	SAD erstellen	5 Sto				Benedikt;Mario[80	
33	<b>√</b>	100% 🕏	Implementation		Tage Di 29.10.	13 Mi 30.10.13		, .	
34	<b>√</b>	100% 📌	UC1 Funktionalität World		-	13 Di 29.10.13		Mario	
35	<b>√</b>	100% 📌	UC1 Oberfläche im	plementieren 8,5 S	Std. Di 29.10.	13 Mi 30.10.13		Mario	
36	<b>√</b>	100% 🕏	Test		Tage Di 29.10.	13 Di 29.10.13			
37	✓	100% 🖈	UC1 cucumber tes	t 6 Sto	d. Di 29.10.	13 Di 29.10.13		Mario	
38	✓	100% 🕏	Deployment	0,13	Tage Di 29.10.	13 Di 29.10.13			
39	✓	100% 📌	UC1 deployment	1 Sto	d. Di 29.10.	13 Di 29.10.13		Benedikt	
40	✓	100% 🕏	Configuration & Cha	nge Managemer 0,63	Tage Di 29.10.	13 Di 29.10.13			
41	✓	100% 📌	GIT JIRA integratio	n 5 Sto	d. Di 29.10.	13 Di 29.10.13		Benedikt	
42	✓	100% 🕏	Project Managemen	t 0,38	Tage Di 29.10.	13 Di 29.10.13			
43	✓ -	100% 📌	Projektplan ergänz	en 2 Sto	d. Di 29.10.	13 Di 29.10.13		Benedikt	
44	<b>√</b>	100% 📌	Präsentation 1. Ser ausarbeiten	mester 3 Sto	d. Di 29.10.	13 Di 29.10.13		Benedikt;Mario	
45	✓ -	100% 🕏	Environment	1,94	Tage Di 29.10.	13 Mi 30.10.13			
46	$\checkmark$	100% 🖈	Einarbeitung GUI [	Desing 15,5	Std. Di 29.10.	13 Mi 30.10.13		Mario	
47	$\checkmark$	100% 📌	manymo.com einr	ichten 1,66	Std. Di 29.10.	13 Di 29.10.13		Benedikt	
48	✓ _	100% 📌	Construction	0 Ta	ge Di 29.10.	13 Di 29.10.13			
			Vorgang Unterbrechung		er Meilenstein er Vorgang	<b>♦</b>	Manueller Sa	ammelrollup	
rojekt	: Tean	nworker	Meilenstein •	Inaktive	er Meilenstein	$\Diamond$	Nur Anfang		
		1.06.14	Sammelvorgang	Inaktive	er Sammelvorgang		Nur Ende	3	
			Projektsammelvorgang -		ller Vorgang		Stichtag	•	
			Externe Vorgänge	Nur Da	uer		In Arbeit		
			1	Se	eite 2				


Nr.			angsrVorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	07. O			
	0	Abgeschlossen							M	) M	D	F
49	<b>V</b>	100%	Business Modelling	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13						
50	<b>V</b>	100%	Requirements	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13						
51	<b>~</b>	100% 🕏	Analysis & Design	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13						
52	<b>√</b>	100% 🕏	Implementation		Mi 01.01.14	Mo 14.04.14						
53	<b>√</b>	100%	UC3	2,5 Std.	Mi 01.01.14	Mi 01.01.14		Mario				
54	<b>√</b>	100% 📌	UC5 Erweiterungen	1 Std.	Mi 01.01.14	Mi 01.01.14		Mario				
55	<b>√</b>	100% 📌	Refactoring	6,5 Std.	Mi 01.01.14	Mi 01.01.14		Benedikt;Mario				
56	~	100% 📌	UC4 und 5 Einarbeitung Ausgabe sinuswellen	4 Std.	Mi 01.01.14	Mi 01.01.14		Mario				
57	$\checkmark$	100% 📌	UC4 und 5 Testcases Metronom	8 Std.	Mi 01.01.14	Mi 01.01.14		Mario				
58	$\checkmark$	100% 📌	UC2 Oberfläche	2 Std.	Do 10.04.14	Do 10.04.14		Benedikt				
59	✓	100% 📌	UC2 Tests implementiert	6 Std.	Mi 01.01.14	Mi 01.01.14		Benedikt				
60	<b>~</b>	100% 📌	UC2 umrechnung Frequenz -> Tonabweichung in cent	4 Std.	Do 10.04.14	Do 10.04.14		Benedikt				
61	✓	100% 📌	UC2 Layout mit graph	10,5 Std.	Mi 01.01.14	Do 02.01.14		Benedikt				
62	✓	100% 📌	UC2 settings erweitern	1,5 Std.	Mi 01.01.14	Mi 01.01.14		Benedikt				
63	~	100% 📌	UC2 implementierung Hintergrundberechnung	15 Std.	Mi 01.01.14	Do 02.01.14		Benedikt				
64	<b>√</b>	100% 📌	UC4 Testimplementierung	6 Std.	Fr 11.04.14	Fr 11.04.14		Mario				
65	✓	100% 📌	UC4 Finalimplementierung	2,5 Std.	Mo 14.04.14	Mo 14.04.14		Mario				
66	✓	100% 🕏	Test	1,25 Tage	Mo 14.04.14	Di 15.04.14						
67	<b>√</b>	100% 📌	Test Coverage	10 Std.	Mo 14.04.14	Di 15.04.14		Benedikt				
68	<b>√</b>	100% 📌	JUnit	4 Std.	Mo 14.04.14	Mo 14.04.14		Benedikt;Mario				
69	$\checkmark$	100% 📌	Deployment	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13						
70	✓	100% 🕏	Configuration & Change Manageme	en 0,5 Tage	Di 29.10.13	Di 29.10.13				$\perp$		
			Vorgang	Externer Meiler	nstein $\diamond$		Manueller Sa	ammelrollup			ì	
			Unterbrechung	Inaktiver Vorga	ng $\Box$		Manueller Sa	ammelvorgang 🕶		—	J	
Projek	t: Tean	nworker	Meilenstein •	Inaktiver Meile	nstein $\Diamond$		Nur Anfang	Г				
	n: Mi 11		Sammelvorgang	Inaktiver Samm	elvorgang $ egt$		Nur Ende	3				
			Projektsammelvorgang	Manueller Vorg	ang 🗀		Stichtag	•				
			Externe Vorgänge	Nur Dauer			In Arbeit				ı	
				Seite 3								_

Nr.		%	Vorgangsr	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	07. Ol	ct '13	
	O	Abgeschlossen								M D	М	D F
71	$\checkmark$	100%	*	Metriken	4 Std.	Di 29.10.13	Di 29.10.13		Mario			
72	✓	100%	*	Project Management	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13					
73	✓	100%	*	Environment	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13					
74	✓	100%	*	Transition	0 Tage	Di 29.10.13	Di 29.10.13					
75	<b>√</b>	100%	*	Business Modelling	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13					
76	✓	100%	*	Requirements	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13					
77	✓	100%	*	Analysis & Design	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13					
78	✓	100%	*	Implementation	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13					
79	✓	100%	*	Test	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13					
80	✓	100%	*	Deployment	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13					
81	✓	100%	*	Configuration & Change Managemen	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13					
82	✓	100%	*	Project Management	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13					
83	✓	100%	*	Environment	1 Tag	Di 29.10.13	Di 29.10.13					




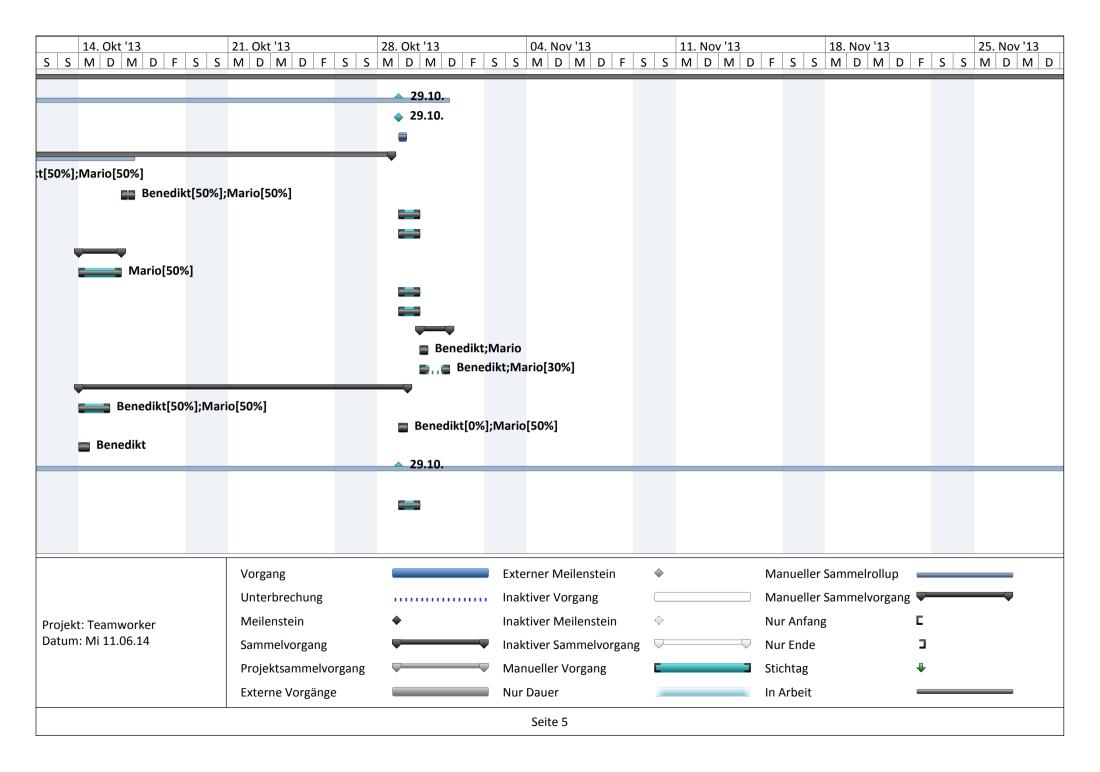



34. Okt 13																																										_			
Benedikt;Mario[80%]  Mario  Mario  Mario  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Mario  Benedikt	6 6										_	_	<u> </u>							Τ,	<u> </u>						_	_						_	<u> </u>										
Mario  Mario  Mario  Mario  Mario  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Mario  Manueller Sammelrollup  Manueller S	5   5	IVI	ו ע	VI   L	DIF	5	5	IVI	ָ ט	IVI	ט	F	5   5	P	VI	וט	IVI	D	F	3	5   3	5	IVI	ָ ט	IVI	ט	F	5	5	IVI	ן ט	IVI	וט	F	5   5	)   ľ	VI   D	)   IVI	D	F	5   5	) IV	ט ווי	IVI	ַ ט
Mario  Mario  Mario  Mario  Mario  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Mario  Manueller Sammelrollup  Manueller S																																													
Mario  Manueller Sammelrollup  Manuell																																													
Mario  Manueller Sammelrollup  Manuell																																													
Mario  Mario  Mario  Mario  Mario  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Mario  Manueller Sammelrollup  Manueller S																																													
Mario  Mario  Mario  Mario  Mario  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Mario  Manueller Sammelrollup  Manueller S																																													
Mario  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Worgang  Vorgang  Vorgang  Letterner Meilenstein  Inaktiver Vorgang  Manueller Sammelrorllup  Manueller Sammelrorlup  Manueller Sammelrorllup  Manueller Sammelrorlup  Manueller S																В	en	edil	kt;N	1ar	io[8	0%	5]																						
Mario  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Benedikt  Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Worgang  Vorgang  Vorgang  Letterner Meilenstein  Inaktiver Vorgang  Manueller Sammelrorllup  Manueller Sammelrorlup  Manueller Sammelrorllup  Manueller Sammelrorlup  Manueller S																																													
Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Vorgang Unterbrechung Unterbrech																<b>■</b> N	/lari	io																											
Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Vorgang Unterbrechung Unterbrech																	= N	/ari	io																										
Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Vorgang Unterbrechung Unterbrech																	IV	ridii	U																										
Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Vorgang Unterbrechung Unterbrech																<b>→</b> N	/lar	io																											
Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Vorgang Unterbrechung Meilenstein Sammelvorgang Projektsammelvorgang Proje															Ţ	— —																													
Benedikt Benedikt;Mario  Wario Benedikt 29.10.  Externer Meilenstein Unterbrechung Unterbrechung Inaktiver Vorgang Manueller Sammelvorgang Sammelvorgang Projektsammelvorgang Manueller Vorgang Nur Ende  Externe Vorgänge Nur Dauer In Arbeit																Ве	ene	dik	t																										
Benedikt Benedikt;Mario  Mario Benedikt 29.10.  Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Projektsammelvorgang Projektsammelvorgang Externer Meilenstein Inaktiver Vorgang Inaktiver Sammelvorgang Manueller Sammelvorgang Inaktiver Sammelvorgang Manueller Vorgang Inaktiver Sammelvorgang Inaktiver S															•																														
Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Projektsammelvorgang  Externer Meilenstein  Inaktiver Vorgang  Inaktiver Meilenstein  Inaktiver Meilenstein  Manueller Sammelrollup  Manueller Sammelvorgang  Manueller Sammelvorgang  Nur Anfang  Inaktiver Sammelvorgang  Nur Ende  Inaktiver Vorgang  Nur Ende  Inaktiver Vorgang  Nur Dauer  In Arbeit																В	ene	edil	κt																										
Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Projektsammelvorgang  Externer Meilenstein  Inaktiver Vorgang  Inaktiver Meilenstein  Inaktiver Meilenstein  Manueller Sammelrollup  Manueller Sammelvorgang  Manueller Sammelvorgang  Nur Anfang  Inaktiver Sammelvorgang  Nur Ende  Reterne Vorgänge  Nur Dauer  In Arbeit																<b>—</b>																													
Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Projektsammelvorgang Projektsamm															_					ari	io																								
Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Projektsammelvorgang Projektsamm																<b>-</b> D	ene	uik	L, IVI	all	iO .																								
Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Projektsammelvorgang Projektsamm																																													
Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Vorgang  Externer Meilenstein  Inaktiver Vorgang  Inaktiver Meilenstein  Inaktiver Meilenstein  Inaktiver Meilenstein  Inaktiver Meilenstein  Inaktiver Sammelvorgang  Inaktiver Sammelvorgang  Inaktiver Sammelvorgang  Nur Ende  Inaktiver Sammelvorgang  Inak																		Ма	rio																										
Vorgang Externer Meilenstein ♦ Manueller Sammelrollup   Unterbrechung Inaktiver Vorgang Manueller Sammelvorgang   Meilenstein ♦ Inaktiver Meilenstein Nur Anfang   Sammelvorgang Inaktiver Sammelvorgang Nur Ende   Projektsammelvorgang Manueller Vorgang Stichtag   Externe Vorgänge Nur Dauer In Arbeit																Ве	ene	dik	t																										
Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Meilenstein Sammelvorgang Inaktiver Vorgang Inaktiver Meilenstein Inaktiver Sammelvorgang Inaktiver Sammelvorgang Projektsammelvorgang Inaktiver Sammelvorgang Inaktiver Meilenstein Nur Ende Inaktiver Sammelvorgang Inaktiver Sammel															4	29.	.10																												_
Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Meilenstein Sammelvorgang Inaktiver Vorgang Inaktiver Meilenstein Inaktiver Sammelvorgang Inaktiver Sammelvorgang Projektsammelvorgang Inaktiver Sammelvorgang Inaktiver Meilenstein Nur Ende Inaktiver Sammelvorgang Inaktiver Sammel								٧/c	rgai	ng											Fy	ter	ner	Mei	lend	teir	<u> </u>		>					Mai	าบอไโอ	r Sa	nm	elroll	un						
Projekt: Teamworker Datum: Mi 11.06.14  Sammelvorgang Projektsammelvorgang Projektsammelvorgang Externe Vorgänge  Meilenstein Inaktiver Meilenstein Nur Anfang Nur Ende Stichtag In Arbeit											hung	J								_							•																	- J	
Datum: Mi 11.06.14  Sammelvorgang Projektsammelvorgang Externe Vorgänge  Inaktiver Sammelvorgang Manueller Vorgang Stichtag In Arbeit	D	<del>-</del>										>			<u></u>												1	<	<b>&gt;</b>														•		
Projektsammelvorgang  Manueller Vorgang  Externe Vorgänge  Nur Dauer  In Arbeit												\a																																	
Externe Vorgänge Nur Dauer In Arbeit													gang.		_					<b>*</b>							gan	රි <u> </u>																	
													garig							<b>▼</b>					иgd	пg														•					
Seite 6								EX	tern	e vo	orgar	nge									Νι	ır L	aue	er ——										ın A	rpeit										
																							Seit	e 6																					

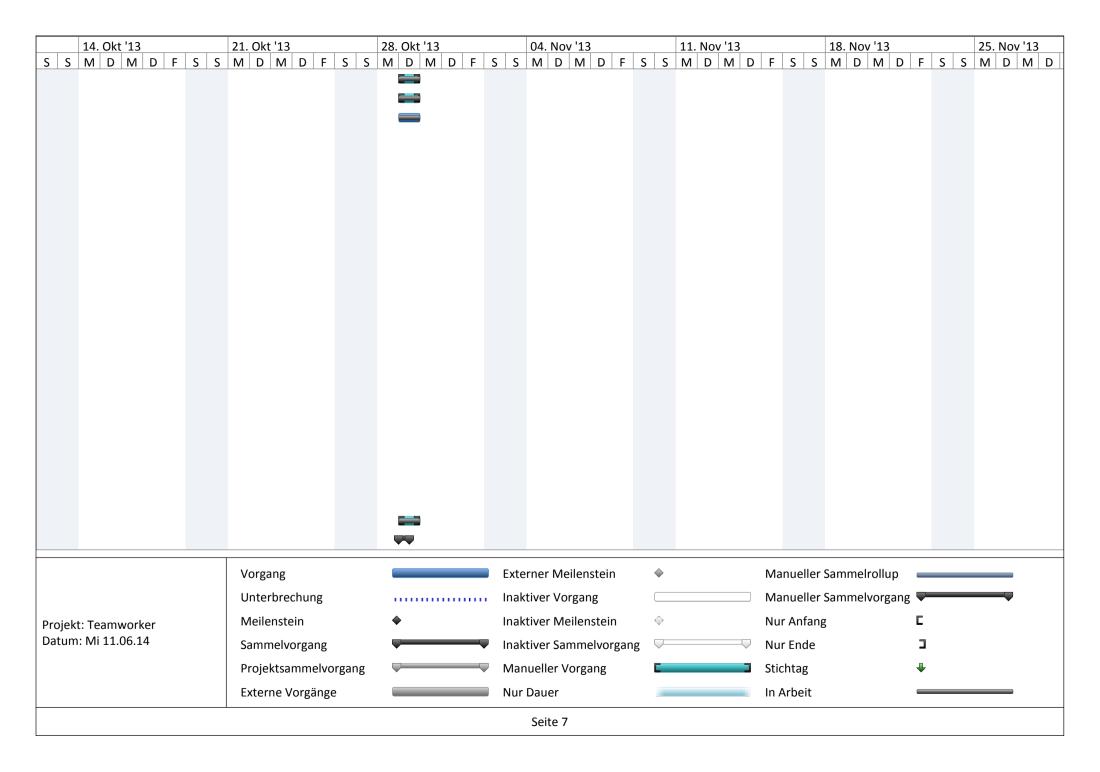



1 1	4. Okt '13		21. Okt	'13			28. Ok	t '13			04. N	ov '13			11. No	ov '13			18.	Nov '13	3			25. No	v '13
SSM	1 D M D F	S S	M D	M D	F	S S	M D	MD	F :	S S	М	M	D F	S S	M D	M	) F	S S	M	D M	D F	S	S	M D	М
								Mario _																	
								_																	
							2	<b>9</b> .10.																	
								=																	
								=																	
			Vorga	ing						Exte	rner M	1eilens	tein	<b></b>			Ma	nueller	· Samı	melroll	up 🕳				1
				ing brechu	ng									<b>♦</b>							up =				1
	- eamworker		Unter				•			Inak	tiver V		g	<ul><li></li></ul>			Ma	nuelle	· Samı		gang 🛡				1
	¯eamworker ⁄li 11.06.14		Unter Meile	brechu			• •			Inak Inak	tiver V tiver N	′organg ∕leilens	g	\$\langle\$			Ma Nu	nuelle	· Samı	melvor	gang 🛡				
			Unter Meile Samn	brechu nstein	ang	gang	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			Inak Inak Inak	tiver V tiver N tiver S	′organg ∕leilens	g tein vorgan	\$\langle\$			Ma Nu Nu	ınuelleı r Anfan	· Samı	melvor	gang 🛡				
			Unter Meile Samn Proje	brechu nstein nelvorga	ang nelvor		*			Inak Inak Inak Man	tiver V tiver N tiver S	organg Meilens ammel Vorgai	g tein vorgan	\$\langle\$			Ma Nu Nu Stic	inuellei r Anfan r Ende	· Samı	melvor	gang 🛡		_		

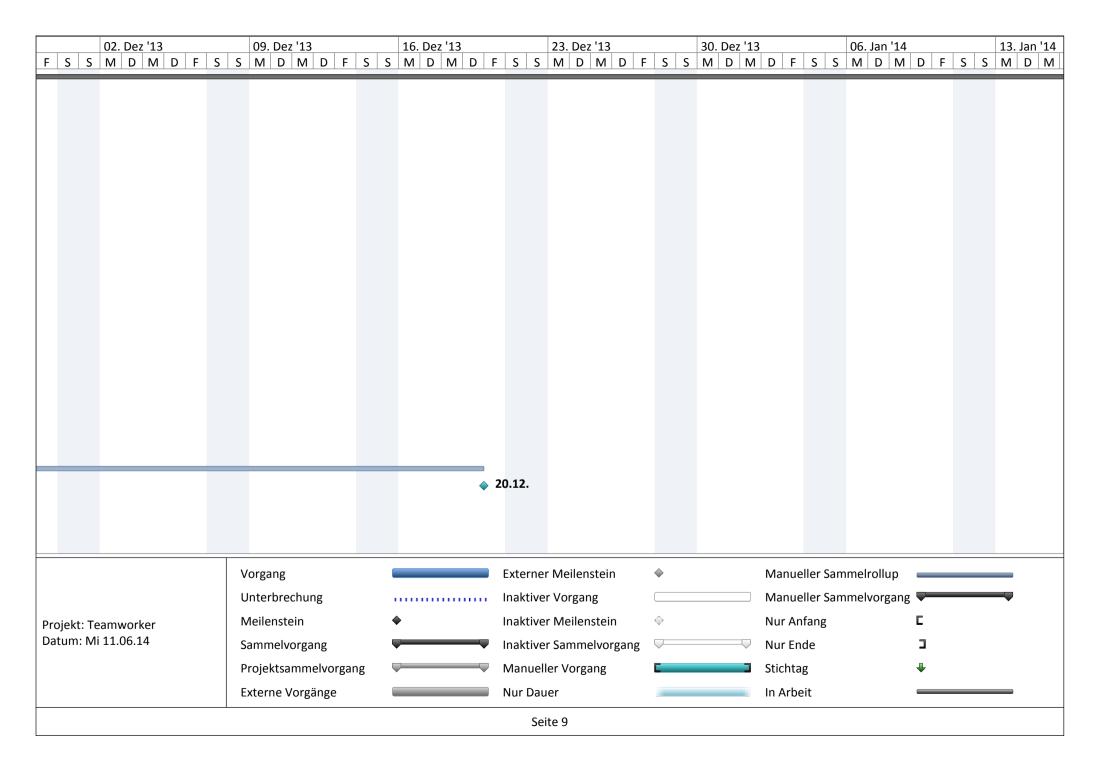


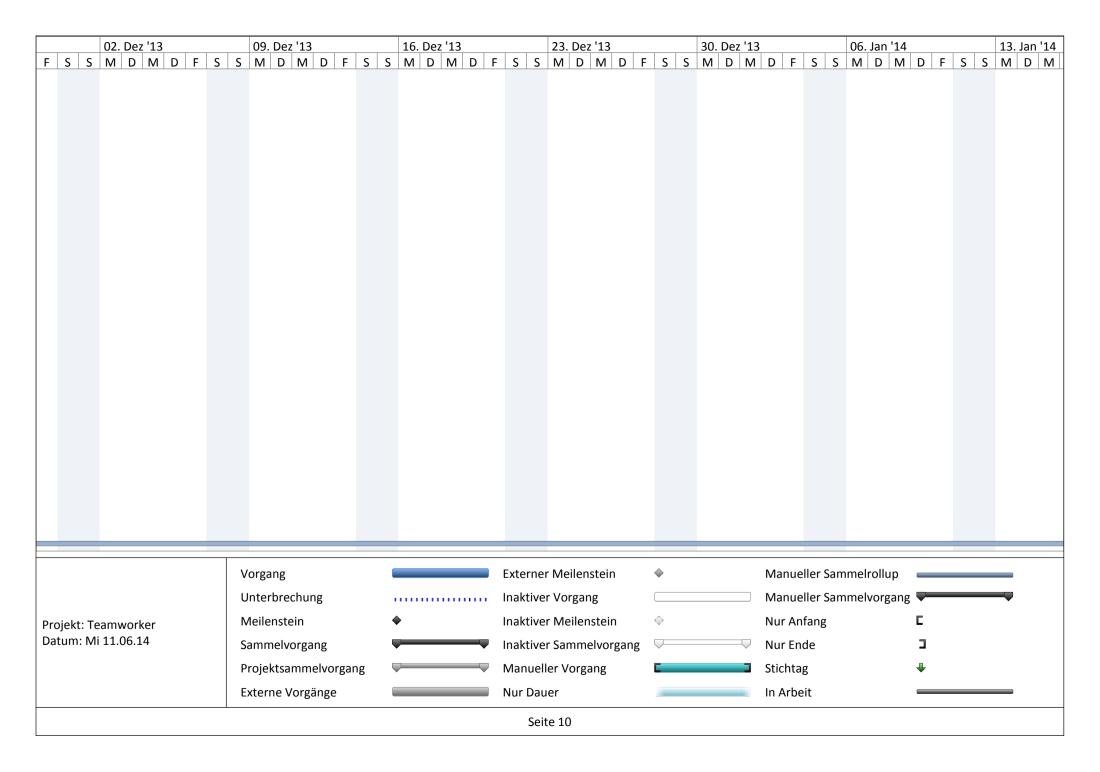

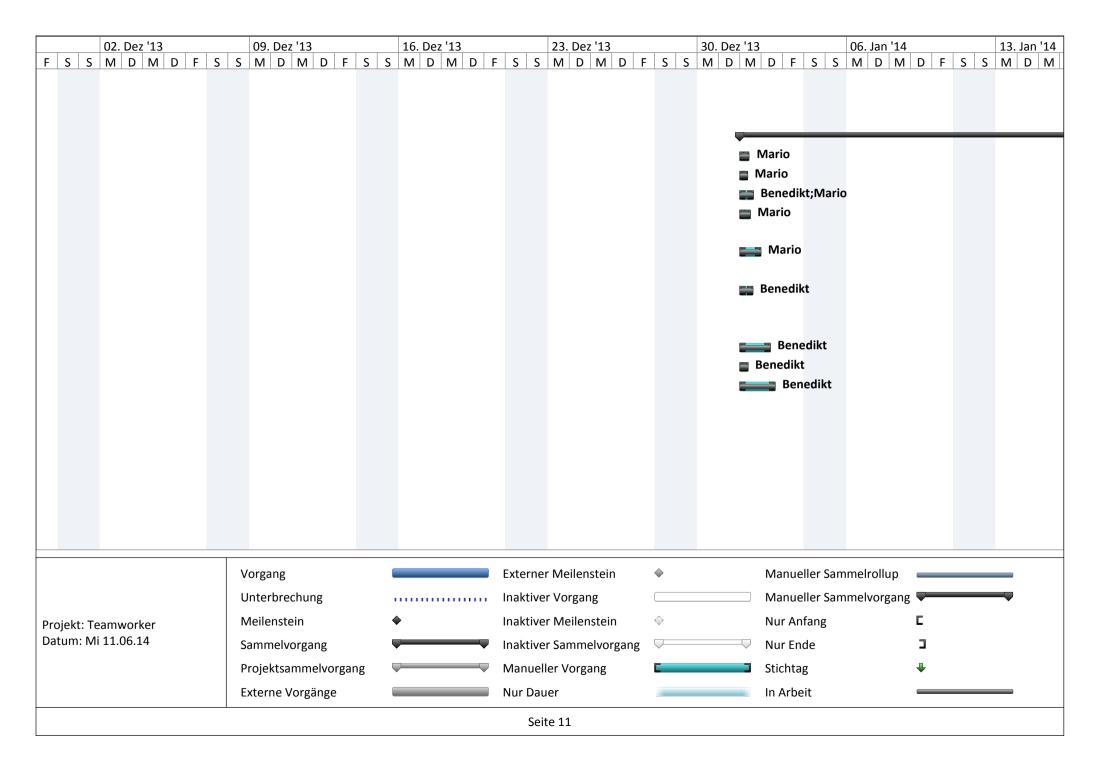


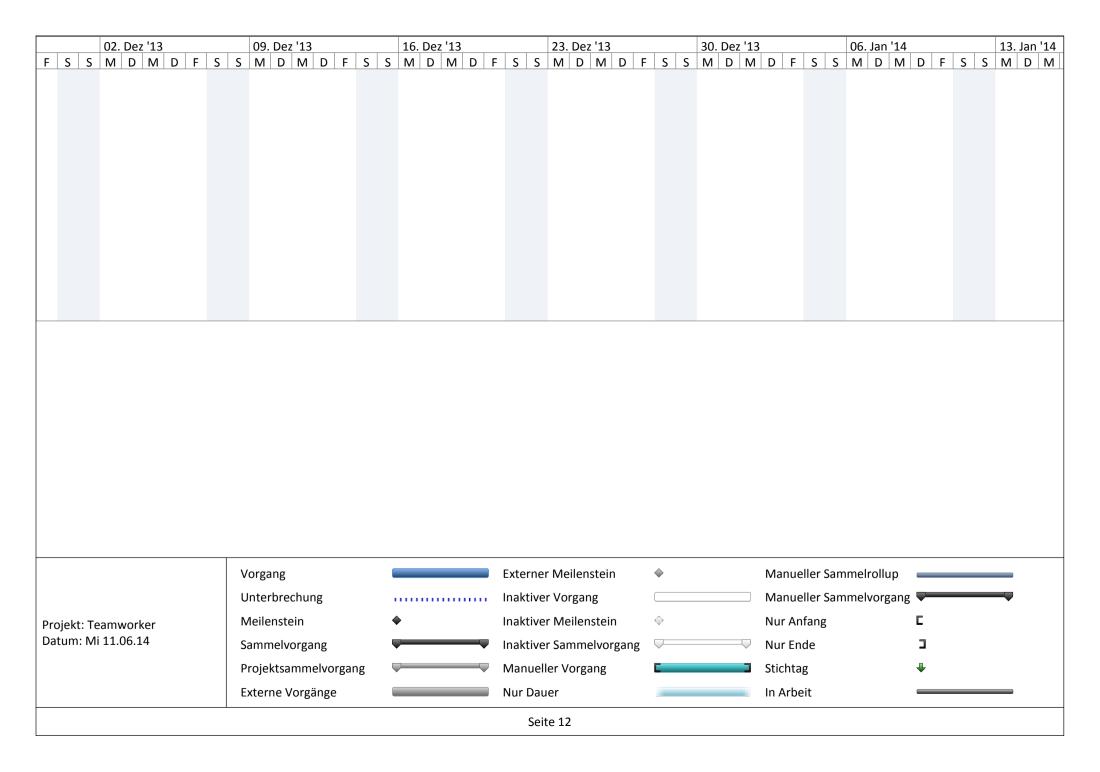


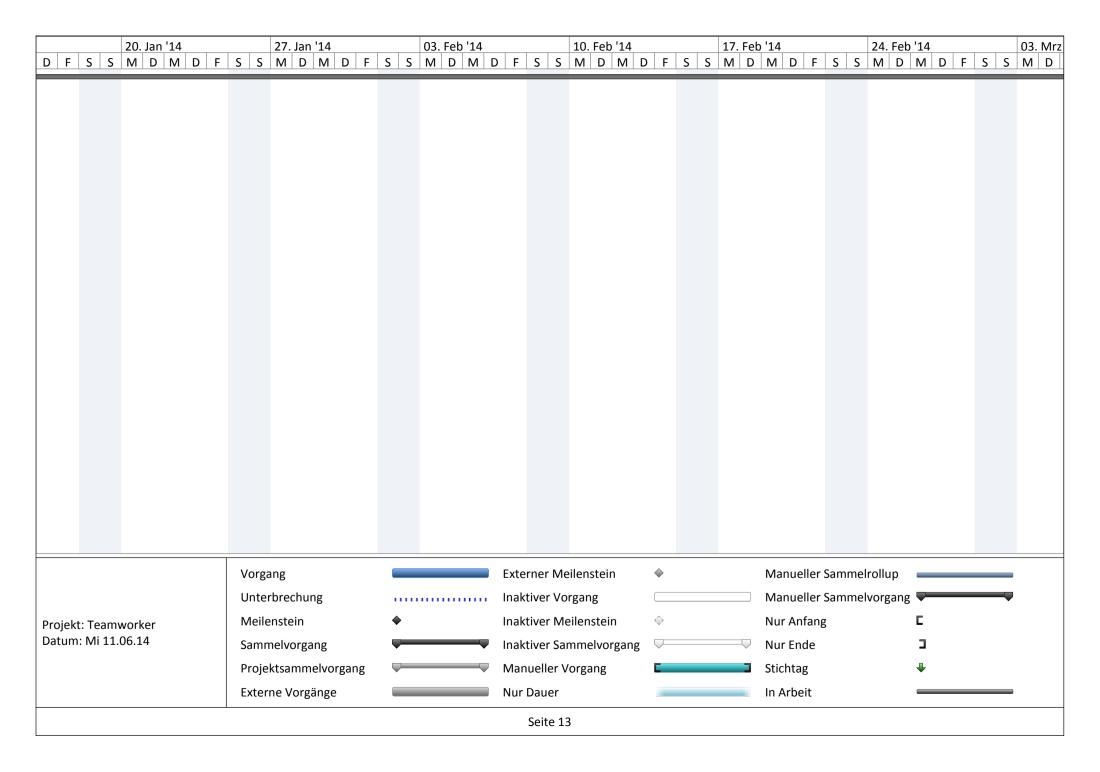


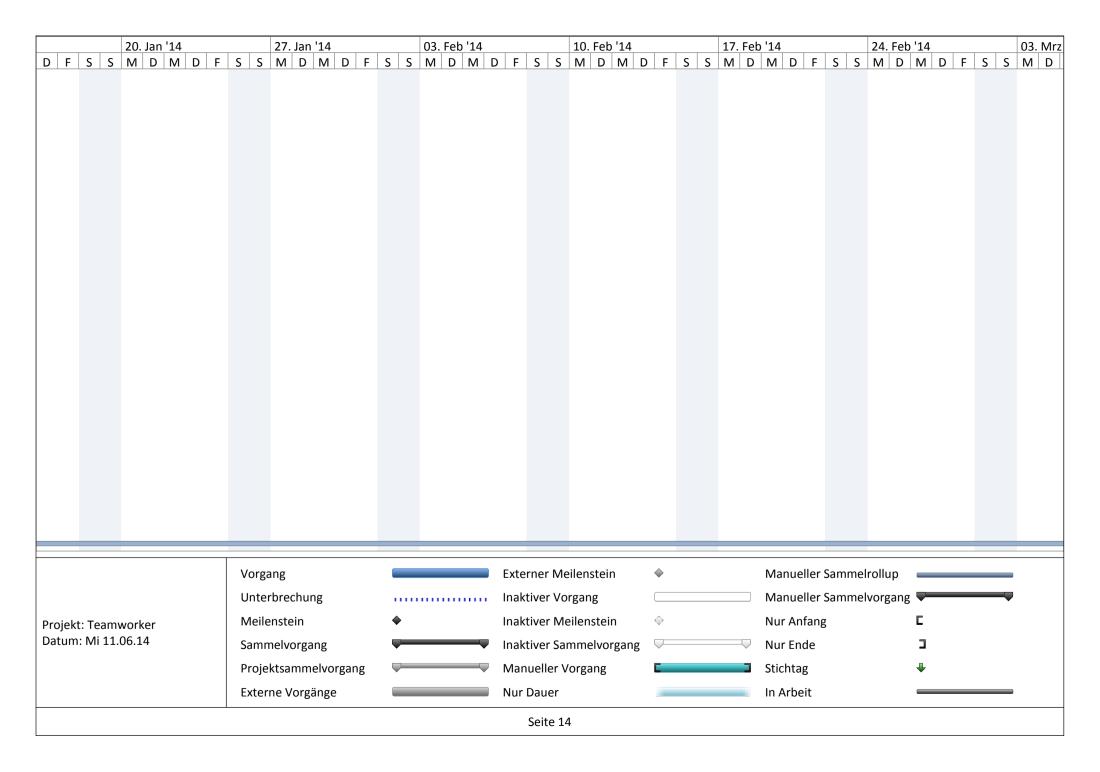


		20. Jan '14		27. Jan '14		03. Feb '14			10. Feb '14			17. Fek	14		24. Feb '1	4		03. Mrz
D F	S S	M D M D	F S S	M D M D F	S S	M D M I	) F	S S	M D M	D F	S S	M D	M D F	S S	M D N	1 D F	S S	M D
			Vorg	ang			Exte	rner Me	ilenstein	<b>\lambda</b>			Manueller	Samme	Irollup =			
				rbrechung				tiver Vo					Manueller					
Projekt	: Team	worker		enstein	<b>•</b>				eilenstein	$\Diamond$			Nur Anfang					
Datum				melvorgang					nmelvorgang				Nur Ende	-	-	1		
				ektsammelvorgang				ueller V					Stichtag		4	7		
				rne Vorgänge			Nur	Dauer					In Arbeit					
								Seite 15	5									
								20.00 10										

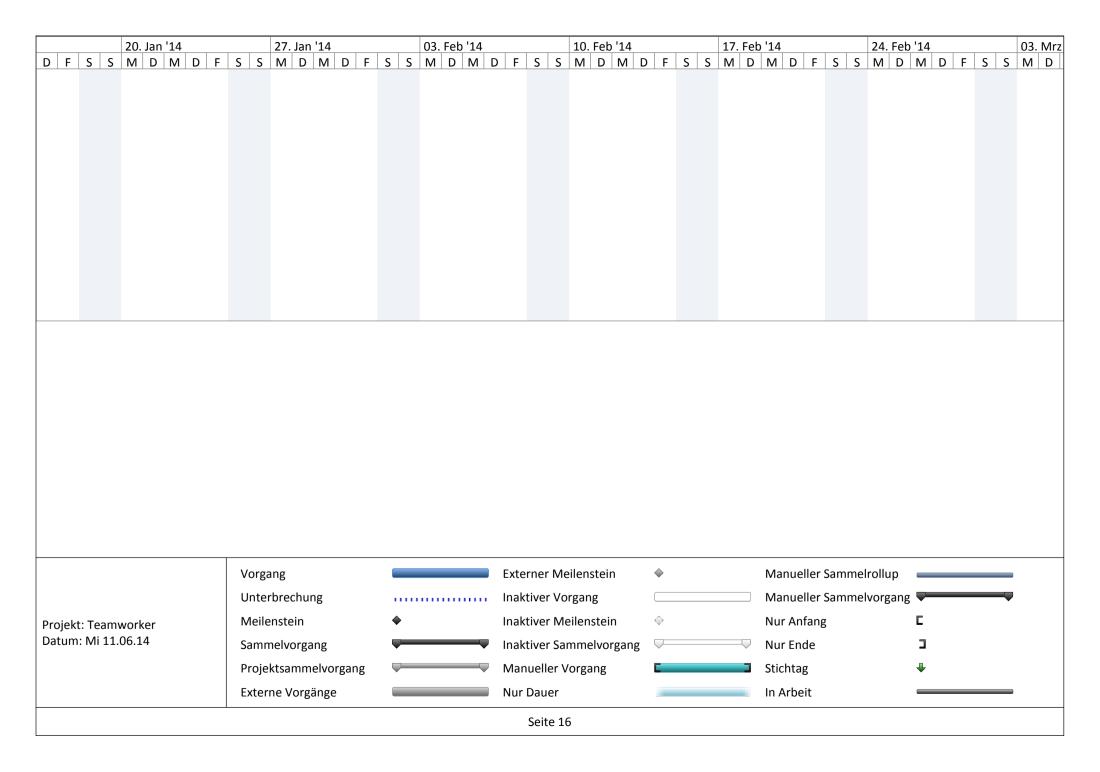

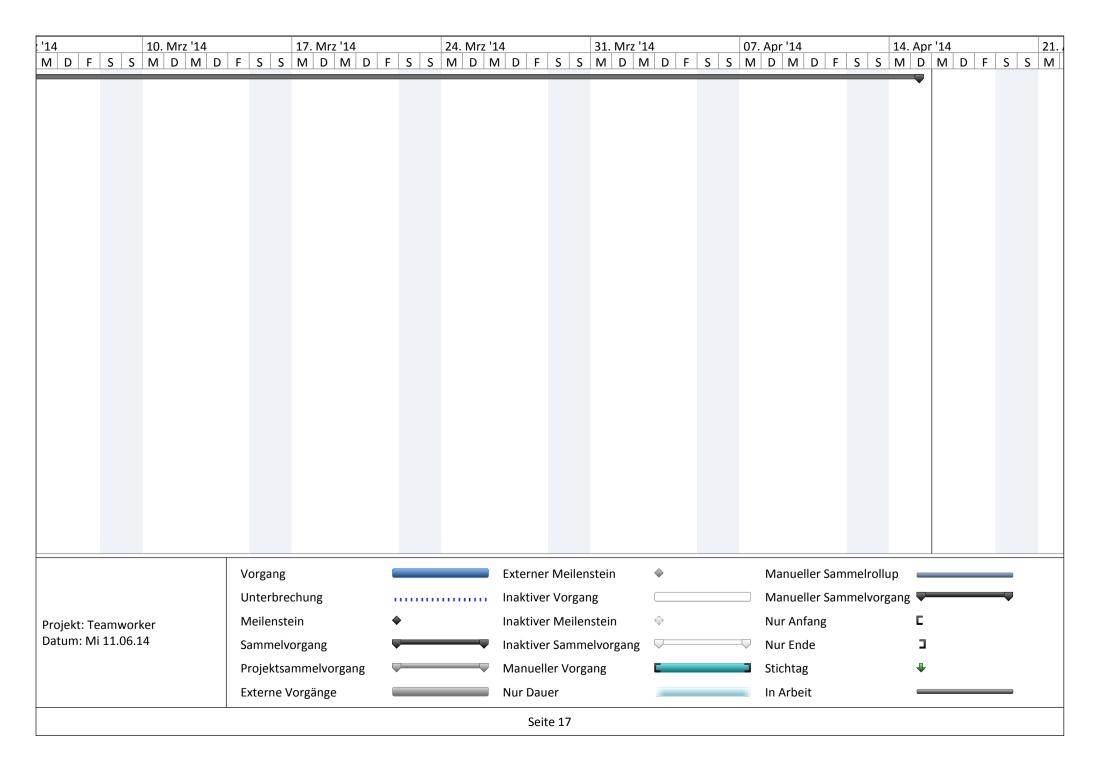

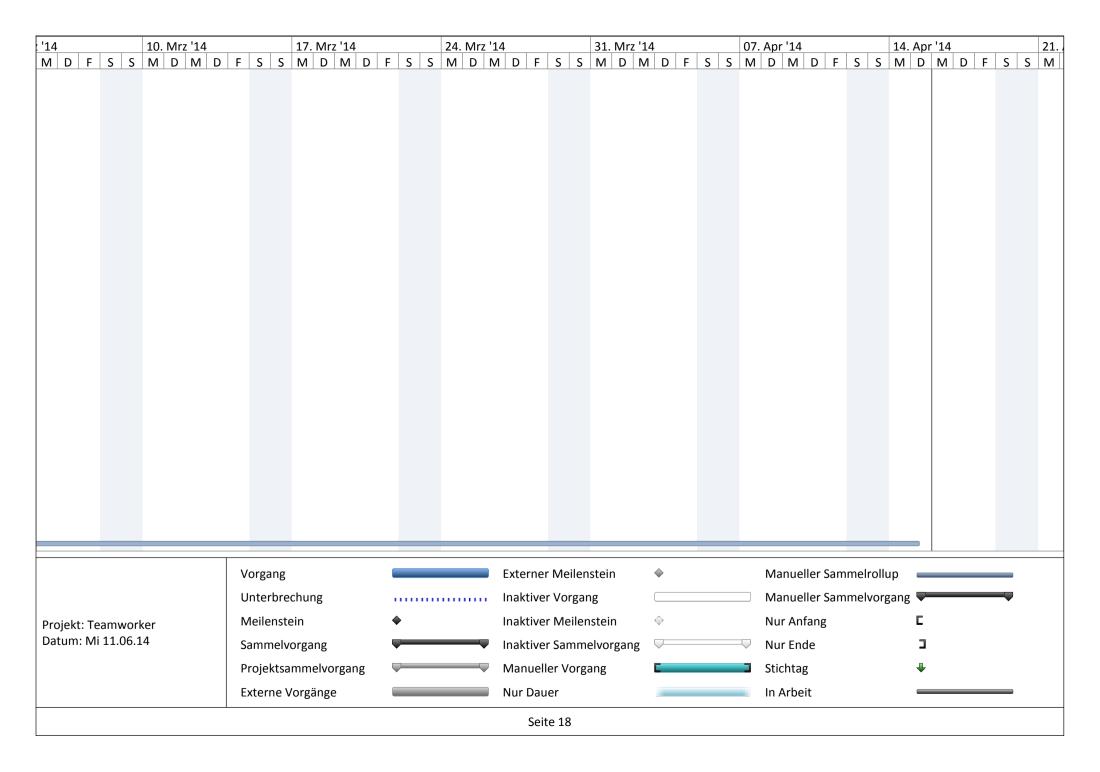

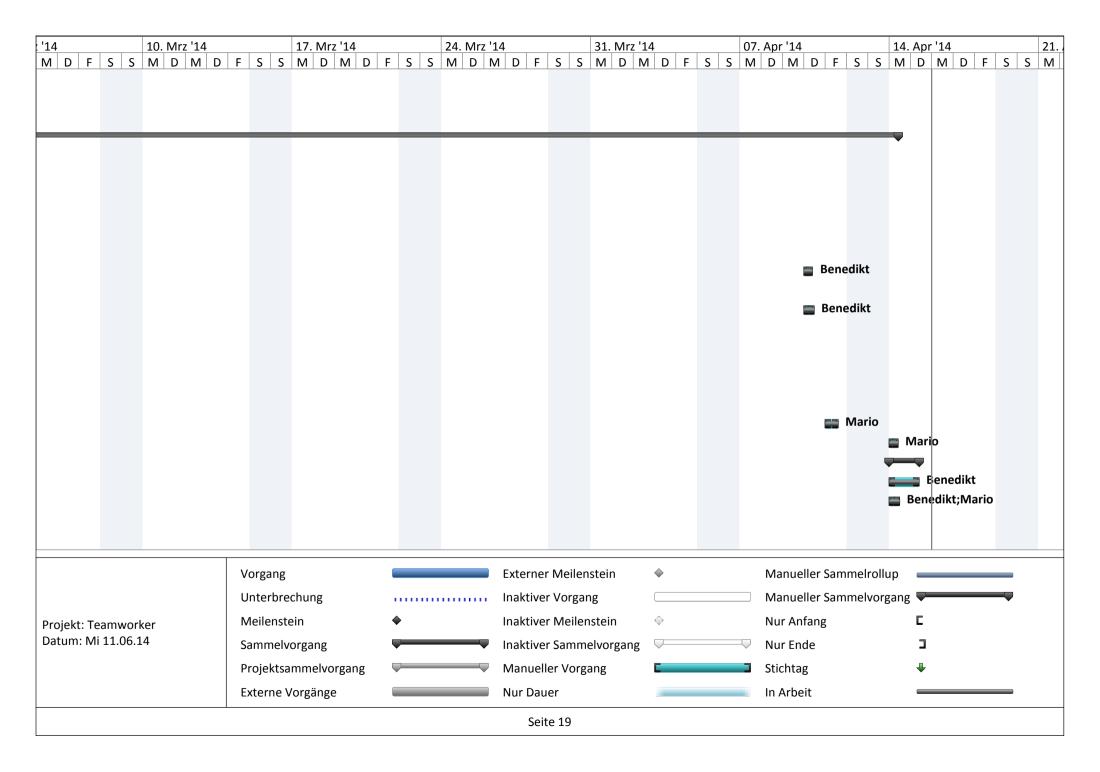

124	D M D F S S M D M D F S S M	F S S M D M D M D F S S M D M D M D F S S M D D M D M D F S S M D M D M D F S S M D M D M D M D F S S M D M D M D F S S M D M D M D M D F S S M D M D M D F S S M D M D M D M D F S S M D M D M D M D F S S M D M D M D M D M D F S S M D M D M D M D F S S M D M D M D M D F S S M D M D M D M D F S S M D M D M D M D F S S M D M D M D M D F S S M D M D M D M D F S S M D M D M D M D F S S M D M D M D M D F S S M D M D M D M D M D F S S M D M D M D M D M D M D M D M D M D			10. ľ	∕Irz '14	ŀ			17.	Mrz	z '14	ļ				24. [	Mrz ':	14				31. N	∕Irz '1	4			07	. Apr	'14				14. /	۱pr'	'14			2
			1 D F	S S	М	D M	D	F	s s	М	D	М	D	F	S	S	М	D N	M [	D F	S	S	М	D M	l D	F	S S	М	D	М	F	S	S	М	D	M [	D F	S	S
Vorgang Externer Meilenstein ♦ Manueller Sammelrollup ————	Manueller Sammelrollup	Vorgang Externer Meilenstein ♦ Manueller Sammelrollup —————						Voi	rgang										Ex	terne	er Me	eilens	stein		•				Ma	nuelle	er San	nmel	Irollu	up					
Vorgang       Externer Meilenstein											ng														•														
Unterbrechung Inaktiver Vorgang Manueller Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Unterbrechung Inaktiver Vorgang Manueller Sammelvorgang	rojekt: Te	amwork	ker			Un	terbre	chur	ng								In	aktive	er Vo	organ	g						Ma	nuelle	r San			gang					
Unterbrechung Inaktiver Vorgang Manueller Sammelvorgang Fojekt: Teamworker Meilenstein Inaktiver Meilenstein Nur Anfang	Manueller Sammelvorgang  Nur Anfang	Unterbrechung						Un <sup>*</sup>	terbre ilenst	echur ein									In:	aktive aktive	er Vo er Mo	organ eilen	g stein		\$\rightarrow\$				Ma Nur	nuelle Anfa	er San ng			gang					
Unterbrechung	Manueller Sammelvorgang  Nur Anfang  Nur Ende	Unterbrechung Inaktiver Vorgang Manueller Sammelvorgang  kt: Teamworker m: Mi 11.06.14 Inaktiver Meilenstein Nur Anfang  Inaktiver Sammelvorgang  Nur Ende  Nur Ende						Un Me Sar	terbre ilenst mmelv	echur ein vorga	ng	organ	ng						In: In: In:	aktive aktive aktive	er Vo er Mo er Sa	organ eilen mme	g stein elvorg		\$\rightarrow\$				Mar Nur Nur	nuelle · Anfa · Ende	er San ng			gang					
Unterbrechung Inaktiver Vorgang Manueller Sammelvorgang  rojekt: Teamworker atum: Mi 11.06.14  Unterbrechung Inaktiver Vorgang Manueller Sammelvorgang  Inaktiver Meilenstein Nur Anfang  Inaktiver Sammelvorgang  Nur Ende	Manueller Sammelvorgang  Nur Anfang  Nur Ende  Stichtag	Unterbrechung  kt: Teamworker m: Mi 11.06.14  Meilenstein  Sammelvorgang  Inaktiver Vorgang  Inaktiver Meilenstein  Inaktiver Sammelvorgang  Inaktiver Sammelvorgang  Manueller Sammelvorgang  Nur Anfang  Nur Ende  Projektsammelvorgang  Manueller Vorgang  Stichtag						Un Me Sar Pro	terbre eilenst mmelv ojektsa	echur ein vorga amm	ng elvo		ng						In: In: In: M	aktive aktive aktive anue	er Vo er Me er Sa ller V	organ eilen mme	g stein elvorg		\$\rightarrow\$				Mar Nur Nur Stic	nuelle · Anfa · Ende htag	er San ng			gang					
