
Ir.	0	% Volume	organgsi	Vorgangsname		Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	07. ( M	Okt '1 D	3 M	
1	•	38%	3	BPM -Start		52 Tage	Mi 09.10.13	Fr 20.12.13			IVI	U	IVI	
2		66%		Inception		0 Tage	Di 29.10.13	Di 29.10.13						
3		0% 🖈		Lifecyle Objectiv	re Milestone	0 Tage								
4	<b>√</b>	100%	-	Business Model		0,13 Tage	Di 29.10.13	Di 29.10.13						
5	<b>√</b>	100% 🖈	-	Requirements			Mi 09.10.13	Mo 28.10.13					_	
6	<b>√</b>	100% 🖈	<b>&gt;</b>	Use Cases Ide	ntifizieren	0,5 Std.	Mi 09.10.13	Mi 09.10.13		Benedikt[50%];Ma			🖺 Вє	ene
7	✓	100% 🖈	<b>&gt;</b>	SRS verfassen		6 Std.	Mi 16.10.13	Mi 16.10.13		Benedikt[50%];Ma				
8		0% 🖈	?	Analysis & Desig	gn									
9		0% 🖈	?	Implementation	າ									
10	<b>√</b>	100% 🖥	\$	Test		2 Tage	Mo 14.10.13	Di 15.10.13						
11	✓	100% 🖈	<b>&gt;</b>	Android Einar	beitung	16 Std.	Mo 14.10.13	Di 15.10.13		Mario[50%]				
12		0% 🖈	?	Deployment										
13		0% 🖈	-	Configuration &	Change Managem	en <sup>-</sup>								
14	<b>√</b>	100% 🖥	\$	Project Manage	ement	1,18 Tage	Mi 30.10.13	Do 31.10.13						
15	<b>√</b>	100% 🖈		Rollen verteile	en	1 Std.	Mi 30.10.13	Mi 30.10.13		Benedikt;Mario				
16	<b>√</b>	100% 🖈		Projektplan e	rstellen	3,4 Std.	Mi 30.10.13	Do 31.10.13		Benedikt;Mario[30				
17	<b>√</b>	100% 🖥		Environment		15,25 Tage	Mo 14.10.13	Mo 04.11.13						
18	<b>√</b>	100% 🖈		IDE einrichter	1	11 Std.	Mo 14.10.13	Di 15.10.13		Benedikt[50%];Ma				
19	<b>√</b>	100% 🛪		Calabash einr	ichten	20 Std.	Di 29.10.13	Mo 04.11.13		Benedikt[0%];Mari				
20	<b>√</b>	100% 🖈		Versionsverw	altung	4 Std.	Mo 14.10.13	Mo 14.10.13		Benedikt				
21		79% 🖈		Elaboration		0 Tage	Di 29.10.13	Di 29.10.13						
22		0% 🛪		Lifecycle Archite		0 Tage	Fr 20.12.13	Fr 20.12.13						
23		0% 🛪	-	Business Model	ling									
24	<b>√</b>	100%		Requirements		1,25 Tage	Mi 09.10.13	Do 10.10.13				•		-
25	<b>√</b>	100%	P	Use Cases aus	sarbeiten	10 Std.	Mi 09.10.13	Do 10.10.13		Benedikt[50%];Ma				
			Vo	rgang		Externer Meile	nstein •		Manueller S	ammelrollup =====				
			Un	terbrechung		Inaktiver Vorga	ng $\Box$		Manueller S	ammelvorgang 🕶		—	į	
Drojakt	t: Toan	mworker	Me	eilenstein	<b>•</b>	Inaktiver Meile	nstein $\Diamond$		Nur Anfang	<b>_</b>				
		)9.12.13		nmelvorgang		Inaktiver Samm			Nur Ende	3				
				ojektsammelvorgang	·	Manueller Vorg	0 0		Stichtag	_ <b>↓</b>				
				erne Vorgänge		Nur Dauer	, <del>.</del>		In Arbeit					
							-							


۱r.	0		gangsrVorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen		0kt '1		
26	<u>.</u>	Abgeschlossen 100%	UC1	2 Std.	Mi 09.10.13	Mi 09.10.13			М	D	M	D
27		100%	UC2	2 Std.	Mi 09.10.13	Mi 09.10.13						
28		100%	UC3	2 Std.	Mi 09.10.13	Mi 09.10.13						
29	·	100%	UC4	2 Std.	Mi 09.10.13	Mi 09.10.13						
30	/	100%	UC5	2 Std.	Mi 09.10.13	Mi 09.10.13						
31	<b>V</b>	100% 🕏	Analysis & Design	0,63 Tage	Di 29.10.13	Di 29.10.13						
32	<b>V</b>	100% 🖈	SAD erstellen	5 Std.	Di 29.10.13	Di 29.10.13		Benedikt;Mario[80				
33		87% 🕏	Implementation	1,06 Tage	Di 29.10.13	Mi 30.10.13		, .				
34	<b>~</b>	100% 🖈	UC1 Funktionalität fü World	_	Di 29.10.13	Di 29.10.13		Mario				
35		80% 📌	UC1 Oberfläche impl	ementieren 8,5 Std.	Di 29.10.13	Mi 30.10.13		Mario				
36	<b>√</b>	100% 🕏	Test	0,75 Tage	Di 29.10.13	Di 29.10.13						
37	<b>√</b>	100% 📌	UC1 cucumber test	6 Std.	Di 29.10.13	Di 29.10.13		Mario				
38	✓	100% 🕏	Deployment	0,13 Tage	Di 29.10.13	Di 29.10.13						
39	<b>√</b>	100% 📌	UC1 deployment	1 Std.	Di 29.10.13	Di 29.10.13		Benedikt				
40	<b>√</b>	100% 🕏	Configuration & Chang	ge Managemer 0,63 Tage	Di 29.10.13	Di 29.10.13						
41	<b>√</b>	100% 📌	GIT JIRA integration	5 Std.	Di 29.10.13	Di 29.10.13		Benedikt				
42		60% 🕏	Project Management	0,38 Tage	Di 29.10.13	Di 29.10.13						
43		0% 🥠	Projektplan ergänzer	n 2 Std.				Benedikt				
44	<b>√</b>	100% 📌	Präsentation 1. Seme ausarbeiten	ester 3 Std.	Di 29.10.13	Di 29.10.13		Benedikt;Mario				
45		82% 🕏	Environment	1,94 Tage	Di 29.10.13	Mi 30.10.13						
46		80% 📌	Einarbeitung GUI Des	sing 15,5 Std.	Di 29.10.13	Mi 30.10.13		Mario				
47	<b>√</b>	100% 📌	manymo.com einrich	nten 1,66 Std.	Di 29.10.13	Di 29.10.13		Benedikt				
48		0% 📌	Construction	0 Tage								
			Vorgang	Externer Meile	nstein $\diamond$		Manueller Sa	ammelrollup				
			Unterbrechung	Inaktiver Vorga	ang $\Box$		Manueller Sa	ammelvorgang 🕶				
Projekt	t: Tean	nworker	Meilenstein •	Inaktiver Meile	enstein $\diamondsuit$		Nur Anfang	С				
		09.12.13	Sammelvorgang	Inaktiver Samn			Nur Ende	3				
			Projektsammelvorgang	Manueller Vor	gang	5	Stichtag	•				
			Externe Vorgänge	Nur Dauer			In Arbeit					
			1	Seite 2								_


Nr.		% Vo	rgangsr	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen	07. O	kt '1:	3	
	0	Abgeschlossen								M	D	М	D
49		0% 🦂		<b>Business Modelling</b>									
50		0% 🥠		Requirements									
51		0% 🥠	•	Analysis & Design									
52		0% 🥠	}	Implementation									
53		0% 🥠	}	Test									
54		0% 🥠	}	Deployment									
55		0% 📌	}	Configuration & Change Management									
56		0% 🥠	}	Project Management									
57		0% 🥠	}	Environment									
58		0% 🥠	}	Transition	0 Tage								



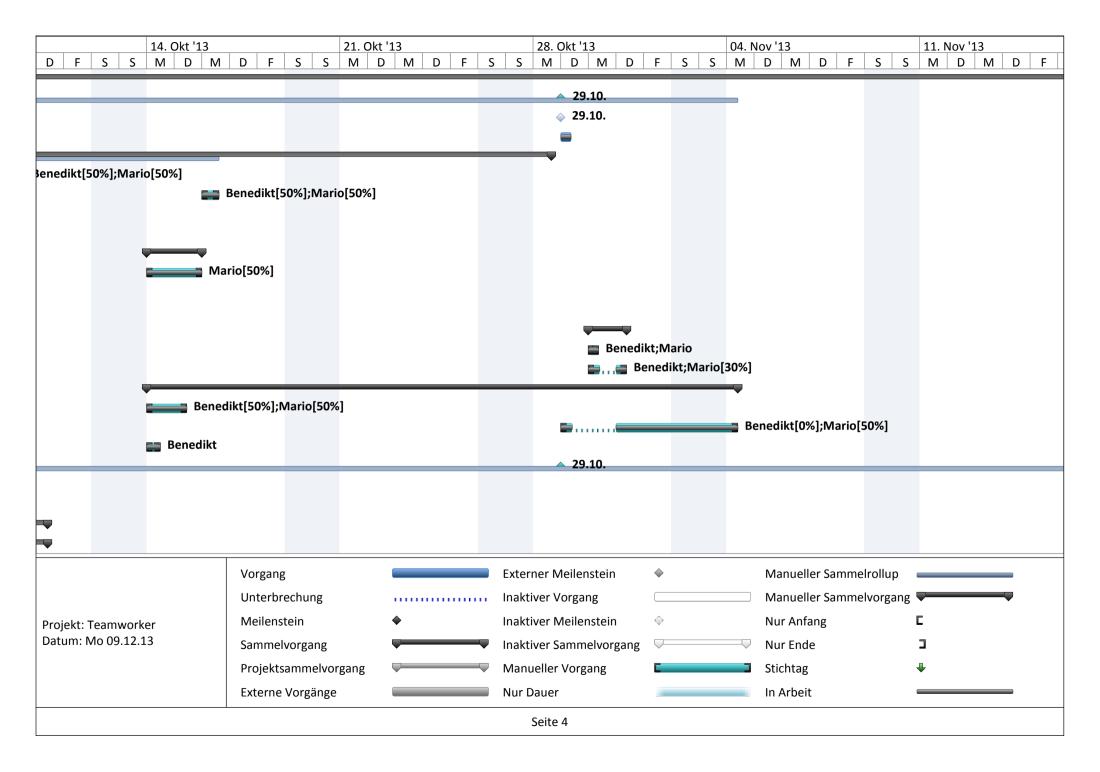

14. Okt '13	2.	1. Okt '13	28. Okt '13	04. Nov '13	11. Nov '13
D F S S M D M			S M D M D F	S S M D M D F S S	
			Benedikt; Mario  Mario  Mario  Benedikt  Benedikt  Benedikt; Mario  Benedikt; Mario  Benedikt; Mario		
	Vorgang		Externer Meilenstein	Manueller Sammelrollup	
	Unterbrechung Moilanstoin			Manueller Sammelvorgang  Nur Anfang	
Projekt: Teamworker Datum: Mo 09.12.13	Meilenstein Sammelvorgang	_	Inaktiver Meilenstein ♦ Inaktiver Sammelvorgang   ✓	Nur Antang  Nur Ende	_ _
	Projektsammelvorga	ng	Manueller Vorgang	Stichtag	<b>-</b>
	Externe Vorgänge	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Nur Dauer	In Arbeit	•
			Seite 5		

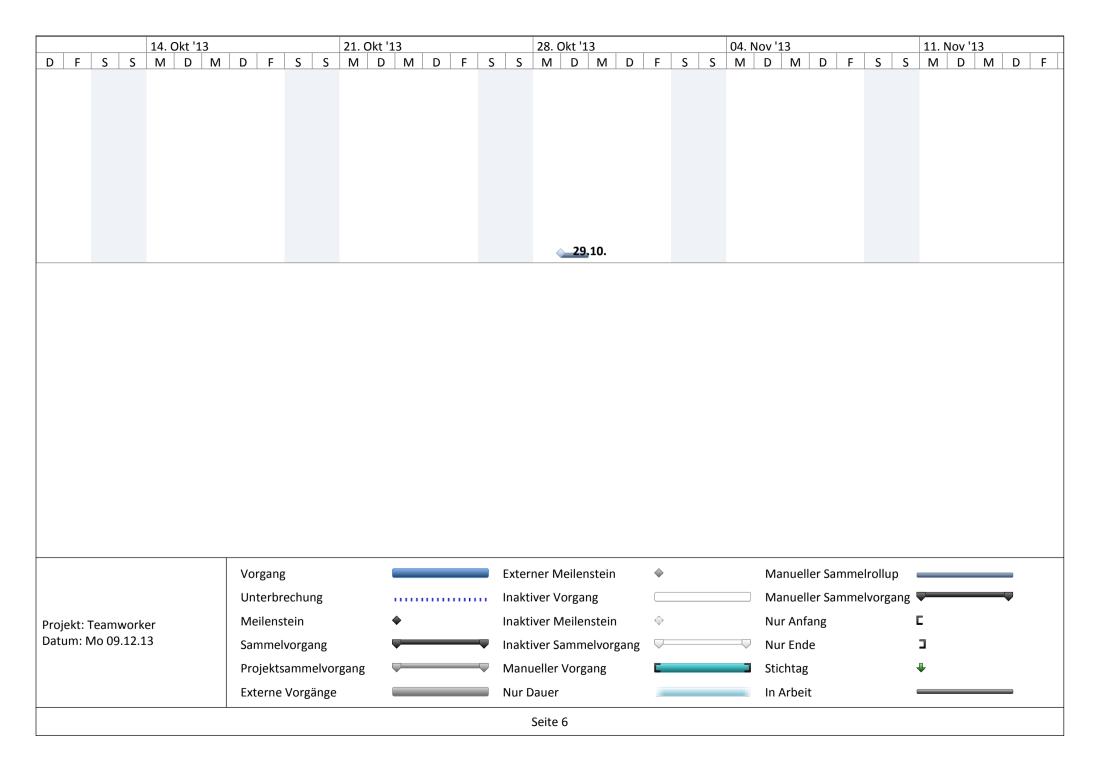

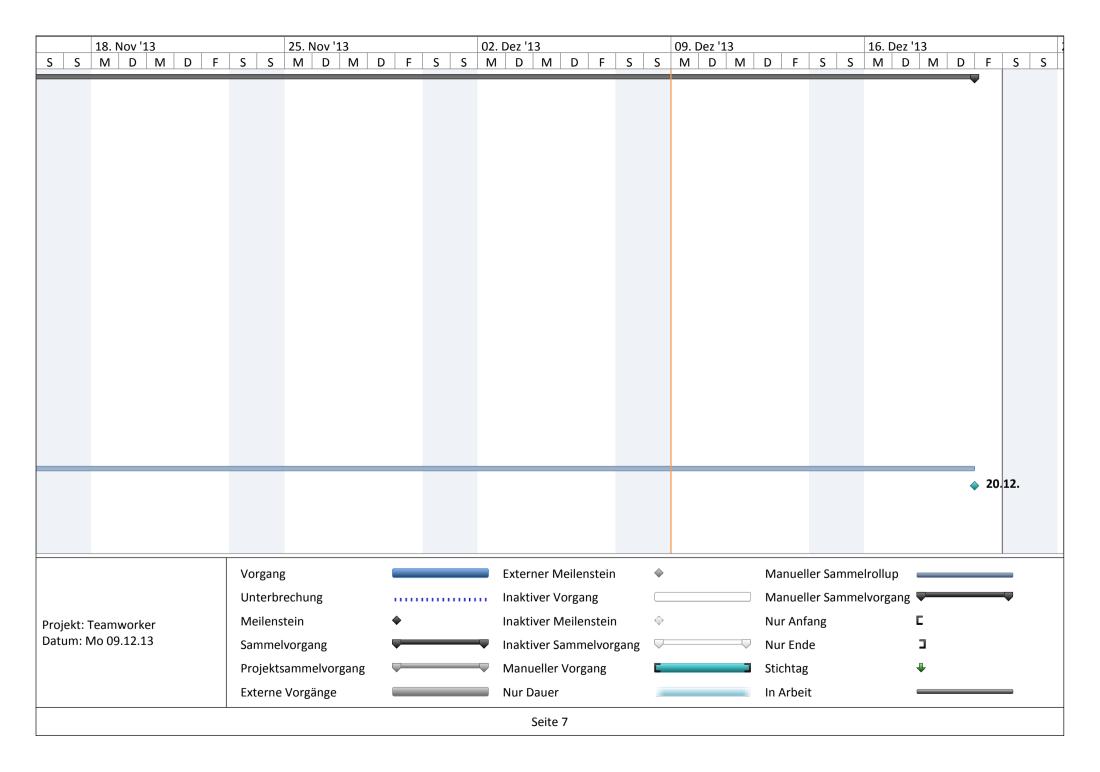

18. Nov '13	25. Nov '13		02. Dez '13	09. Dez '13	16. Dez	'13	
S S M D M D F			M D M D F S	S M D M		M D F	S S
Projekt: Teamworker Datum: Mo 09.12.13	Vorgang Unterbrechung Meilenstein Sammelvorgang Projektsammelvorgang Externe Vorgänge	<b>+</b>	Externer Meilenstein Inaktiver Vorgang Inaktiver Meilenstein Inaktiver Sammelvorgang Manueller Vorgang Nur Dauer	•	Manueller Sammelrollup Manueller Sammelvorgang Nur Anfang Nur Ende Stichtag In Arbeit	C □	-
			Seite 8				

18. Nov '13	25. Nov '13	n	2. Dez '13	09. Dez '13		16. Dez '13	
			M D M D F S		D F S S	M D M D F	S
	Vorgang		Externer Meilenstein	<b>♦</b>	Manueller Samme	lrollup	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Manueller Samme	Ivorgang 🛡	
	Uniterprechang						<b>-</b>
oiekt: Teamworker	Meilenstein	<b>♦</b>	Inaktiver Meilenstein	$\Diamond$	Nur Anfang		-
		<b>*</b>	Inaktiver Meilenstein Inaktiver Sammelvorgang	♦	Nur Anfang Nur Ende	<u> </u>	<b>-</b>
ojekt: Teamworker atum: Mo 09.12.13	Meilenstein	<b>*</b>				_	-
	Meilenstein Sammelvorgang	<b>\</b>	Inaktiver Sammelvorgang		Nur Ende	_	•
	Meilenstein Sammelvorgang Projektsammelvorgang	<b>\</b>	Inaktiver Sammelvorgang  Manueller Vorgang		Nur Ende Stichtag	_	_
